



UNIBRA

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO

FACULDADE
IBGM IBS INSTITUTO
BRASILEIRO
DE SAÚDE

AULA 5 - DISCIPLINA: FGD
PROF: Ismael Rodrigues

GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

É a atividade mais importante do gerenciamento de projetos é o Gerenciamento do Escopo do projeto

É no escopo que está definido todo o trabalho que devemos realizar garantindo que apenas o que foi definido seja realizado.

Erros no escopo podem arruinar com um projeto inteiro.



GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

O gerenciamento do escopo do projeto **inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho, e apenas o necessário, para que termine com sucesso.**

O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com definir e controlar o que está e o que não está incluído no projeto



Os processos de gerenciamento do escopo do projeto são:

- 1. Planejar o gerenciamento do escopo** - O processo de criar um plano de gerenciamento do escopo que documenta como os escopos do projeto e do produto serão definidos, validados e controlados.
- 2. Coletar os requisitos** - O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.
- 3. Definir o escopo** - O processo de desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do produto

Os processos de gerenciamento do escopo do projeto são:

4. Criar a EAP - O processo de subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

5. Validar o escopo - O processo de formalizar a aceitação das entregas concluídas do projeto.

6. Controlar o escopo - O processo de monitorar o status do escopo do projeto e do produto e gerenciar as mudanças feitas na linha de base do escopo.

Visão geral do Gerenciamento do Escopo do Projeto

5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Análise de dados
 - .3 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento do escopo
 - .2 Plano de gerenciamento dos requisitos

5.4 Criar a EAP

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto

5.2 Coletar os Requisitos

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Documentos de negócios
 - .5 Acordos
 - .6 Fatores ambientais da empresa
 - .7 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Coleta de dados
 - .3 Análise de dados
 - .4 Tomada de decisões
 - .5 Representação de dados
 - .6 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .7 Diagramas de contexto
 - .8 Protótipos
- .3 Saídas
 - .1 Documentação dos requisitos
 - .2 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

5.3 Definir o Escopo

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Análise de dados
 - .3 Tomada de decisões
 - .4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .5 Análise de produto
- .3 Saídas
 - .1 Especificação do escopo do projeto
 - .2 Atualizações de documentos do projeto

5.6 Controlar o Escopo

requisitos

5.4 Criar a EAP

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Decomposição
- .3 Saídas
 - .1 Linha de base do escopo
 - .2 Atualizações de documentos do projeto

- .3 Representação de dados
- .6 Habilidades interpessoais e de equipe
- .7 Diagramas de contexto
- .8 Protótipos

- .3 Saídas
 - .1 Documentação dos requisitos
 - .2 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

5.5 Validar o Escopo

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Entregas verificadas
 - .4 Dados de desempenho do trabalho
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Inspeção
 - .2 Tomada de decisões
- .3 Saídas
 - .1 Entregas aceitas
 - .2 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .3 Solicitações de mudança
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

.3 Saídas

- .1 Especificação do escopo do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto

5.6 Controlar o Escopo

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Dados de desempenho do trabalho
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Análise de dados
- .3 Saídas
 - .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

CONCEITOS ESSENCIAIS PARA GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

No contexto do projeto, o termo “escopo” pode se referir a:



Escopo do projeto

Como: Trabalho necessário para construir o projeto.



Escopo do produto

O que: Características funcionais para construir o produto.



ATIVIDADE 1 – PLANEJAR O GERENCIAMENTO DO ESCOPO

É o processo de criar um plano que documenta como o escopo do projeto e do produto será definido, validado e controlado.

O principal benefício deste processo é o fornecimento de orientação e instruções sobre como o escopo será gerenciado ao longo de todo o projeto.

Planejar o Gerenciamento do Escopo

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento da qualidade
 - Descrição do ciclo de vida do projeto
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
 - Análise de alternativas
- .3 Reuniões

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do escopo
- .2 Plano de gerenciamento dos requisitos



Exemplo de plano de gerenciamento de escopo do projeto

Construção

Quando se define a realização de uma obra, o construtor sabe que precisa...

1. Levantar uma cerca para definir os limites da construção.
2. Escavamento do terreno para produzir as fundações,
3. Levantamento das paredes
4. todos os sistemas que compõem uma casa ou edifício, como água, esgoto e parte elétrica;
5. Colocação de janelas
6. Acabamentos das partes externas e internas, como a colocação de pisos, pinturas e sistema de iluminação decorativa

Inicialmente é preciso de preocupar com as seguintes questões..

- Quanto vai ser preciso de material?
- Quantas pessoas serão necessárias para concluir a obra?
- Que equipamentos serão necessários para o trabalho bem feito?



ATIVIDADE 2 – COLETAR OS REQUISITOS

É processo o atividade que consiste em listar as características e funcionalidades que o produto deve ter para atender às necessidades dos clientes.



Os requisitos podem ser divididos em:

Requisitos funcionais

Estão diretamente ligados ao produto. descrevem as funcionalidades do sistema a ser projetado.

- ex: RF01 - O sistema deve permitir que o usuário faça login no sistema usando seu nome de usuário e senha.
- RF02- O sistema deve enviar um e-mail de confirmação ao usuário após a realização do pedido com sucesso.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais explicam as limitações e restrições do sistema a ser projetado. Podem ser classificados em:

Performance

[NF01] Tempo de resposta

O tempo de resposta de uma consulta de um usuário deve ser de no máximo 05 segundos.

4[NF002] Erros por dia

O sistema deve ser capaz de funcionar com um número de erros inferior a 3 por dia.

Requisitos não funcionais

Usabilidade

[NF003] Interface gráfica com o usuário

A interface deverá ser amigável, simples e intuitiva. A preocupação com as duas últimas características é devida ao fato de possivelmente o usuário não ter muita experiência com o uso do computador. Desta forma, as mensagens de erro devem ser explicativas, de modo a mostrar ao usuário como ele deve agir.

Casos de uso associados: todos.

[NF004] Existência de Help

O sistema deve disponibilizar um help, para esclarecer eventuais dúvidas dos usuários.

Requisitos não funcionais

Confiabilidade

[NF005] Disponibilidade

O sistema tem que estar sempre disponível (24 horas por dia).

[NF006] Consistência dos dados

Caso ocorra algum erro no processamento de uma transação, o programa deve retornar para um estado anterior consistente, sem que haja o comprometimento da coerência dos dados armazenados.

Requisitos não funcionais

Segurança

[NF007] Restrições de acesso

A confidencialidade dos dados do cliente é assegurada pela utilização de um servidor de banco de dados seguro e por um mecanismo de acesso autorizado, no qual cada cliente utiliza um login e uma senha para poder acessar o sistema. Ou seja, cada ator terá acesso a funcionalidades personalizadas.

Corretude

[NF008] Correção dos dados

O sistema deve sempre retornar dados válidos para o usuário.

Requisitos não funcionais

Requisitos de Hardware e Software

[NF009] Hardware

Os computadores que acessarem o programa EOSystem devem ter no mínimo um processador Pentium 200MHz ou compatível e 32MB de memória RAM. Isso porque essa é a configuração mínima exigida para que a máquina virtual de Java rode.

[NF010] Software

O sistema vai ser implementado usando a linguagem Java.

Templates para cadastro de requisitos

Requisito Funcional

[RF01] Cadastrar usuários no sistema

Descrição

O sistema deve permitir que o diretor realize o cadastro de novos usuários com as devidas permissões para secretario ou para instrutor.

prioridade

Essencial

Requisito Não Funcional

[NF27] Restrições de acesso

Descrição

A confidencialidade dos dados do cliente é assegurada pela utilização de um servidor de banco de dados seguro e por um mecanismo de acesso autorizado, no qual cada cliente utiliza um login e uma senha para poder acessar o sistema. Ou seja, cada ator terá acesso a funcionalidades personalizadas.

Tipo de requisito

Segurança

GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

ATIVIDADE 3 - DEFINIR O ESCOPO

Definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.

O principal benefício desse processo é que ele descreve os **limites do produto, serviço ou resultado, prazos, entregáveis e os critérios para aceitação.**



ATIVIDADE 3 - DEFINIR O ESCOPO

Definir o Escopo

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
- .3 Documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Documentação dos requisitos
 - Registro dos riscos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
 - Análise de alternativas
- .3 Tomada de decisões
 - Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos
- .4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - Facilitação
- .5 Análise de produto

Saídas

- .1 Especificação do escopo do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Documentação dos requisitos
 - Matriz de rastreabilidade dos requisitos
 - Registro das partes interessadas

ATIVIDADE 3 - DEFINIR O ESCOPO

DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

A declaração do escopo do projeto é a descrição do escopo do projeto, principais entregas, premissas e restrições. **Esse documento inclui:**

- Todo o escopo, incluindo o escopo do projeto e do produto.
- As entregas do projeto em detalhes.
- Exclusões do projeto

O grau e o nível de detalhamento da declaração do escopo pode determinar o sucesso do projeto

ATIVIDADE 3 - DEFINIR O ESCOPO

DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

A especificação detalhada do escopo do projeto inclui:

Descrição do escopo do produto - Elabora progressivamente as características do produto, serviço ou resultado descritas no termo de abertura do projeto e na documentação dos requisitos.

Entregas - Qualquer produto, resultado ou capacidade de realizar um serviço, que seja único, verificável e necessário para concluir um processo, fase ou projeto. As entregas também incluem os resultados auxiliares, tais como relatórios e documentação de gerenciamento do projeto. Essas entregas podem ser descritas em nível conciso ou em grande detalhe.

ATIVIDADE 3 - DEFINIR O ESCOPO

DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

A especificação detalhada do escopo do projeto inclui:

Critérios de aceitação - Um conjunto de condições que precisam ser atendidas antes que as entregas sejam aceitas.

Exclusões do projeto - Identifica o que é excluído do projeto. Declarar explicitamente o que está fora do escopo do projeto ajuda no gerenciamento das expectativas das partes interessadas e pode reduzir a distorção de escopo.

ATIVIDADE 3 - DEFINIR O ESCOPO

DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

IMPORTANTE!!!

Embora o termo de abertura do projeto e a declaração do escopo do projeto sejam às vezes percebidos como contendo um certo grau de redundância, eles diferem no nível de detalhes em cada um. O termo de abertura do projeto contém informações de alto nível, e a declaração do escopo do projeto contém uma descrição detalhada dos elementos do escopo.

O modelo da declaração que iremos usar já está na classroom

ATIVIDADE 4 - CRIAR A EAP

Criar a EAP é o processo de decompor as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

O principal benefício desse processo é que ele **fornece uma visão estruturada do que deve ser entregue.**

ATIVIDADE 4 - CRIAR A EAP

Criar a EAP

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Especificação do escopo do projeto
 - Documentação dos requisitos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais


Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição

Saídas

- .1 Linha de base do escopo
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Documentação dos requisitos

ATIVIDADE 4 - CRIAR A EAP

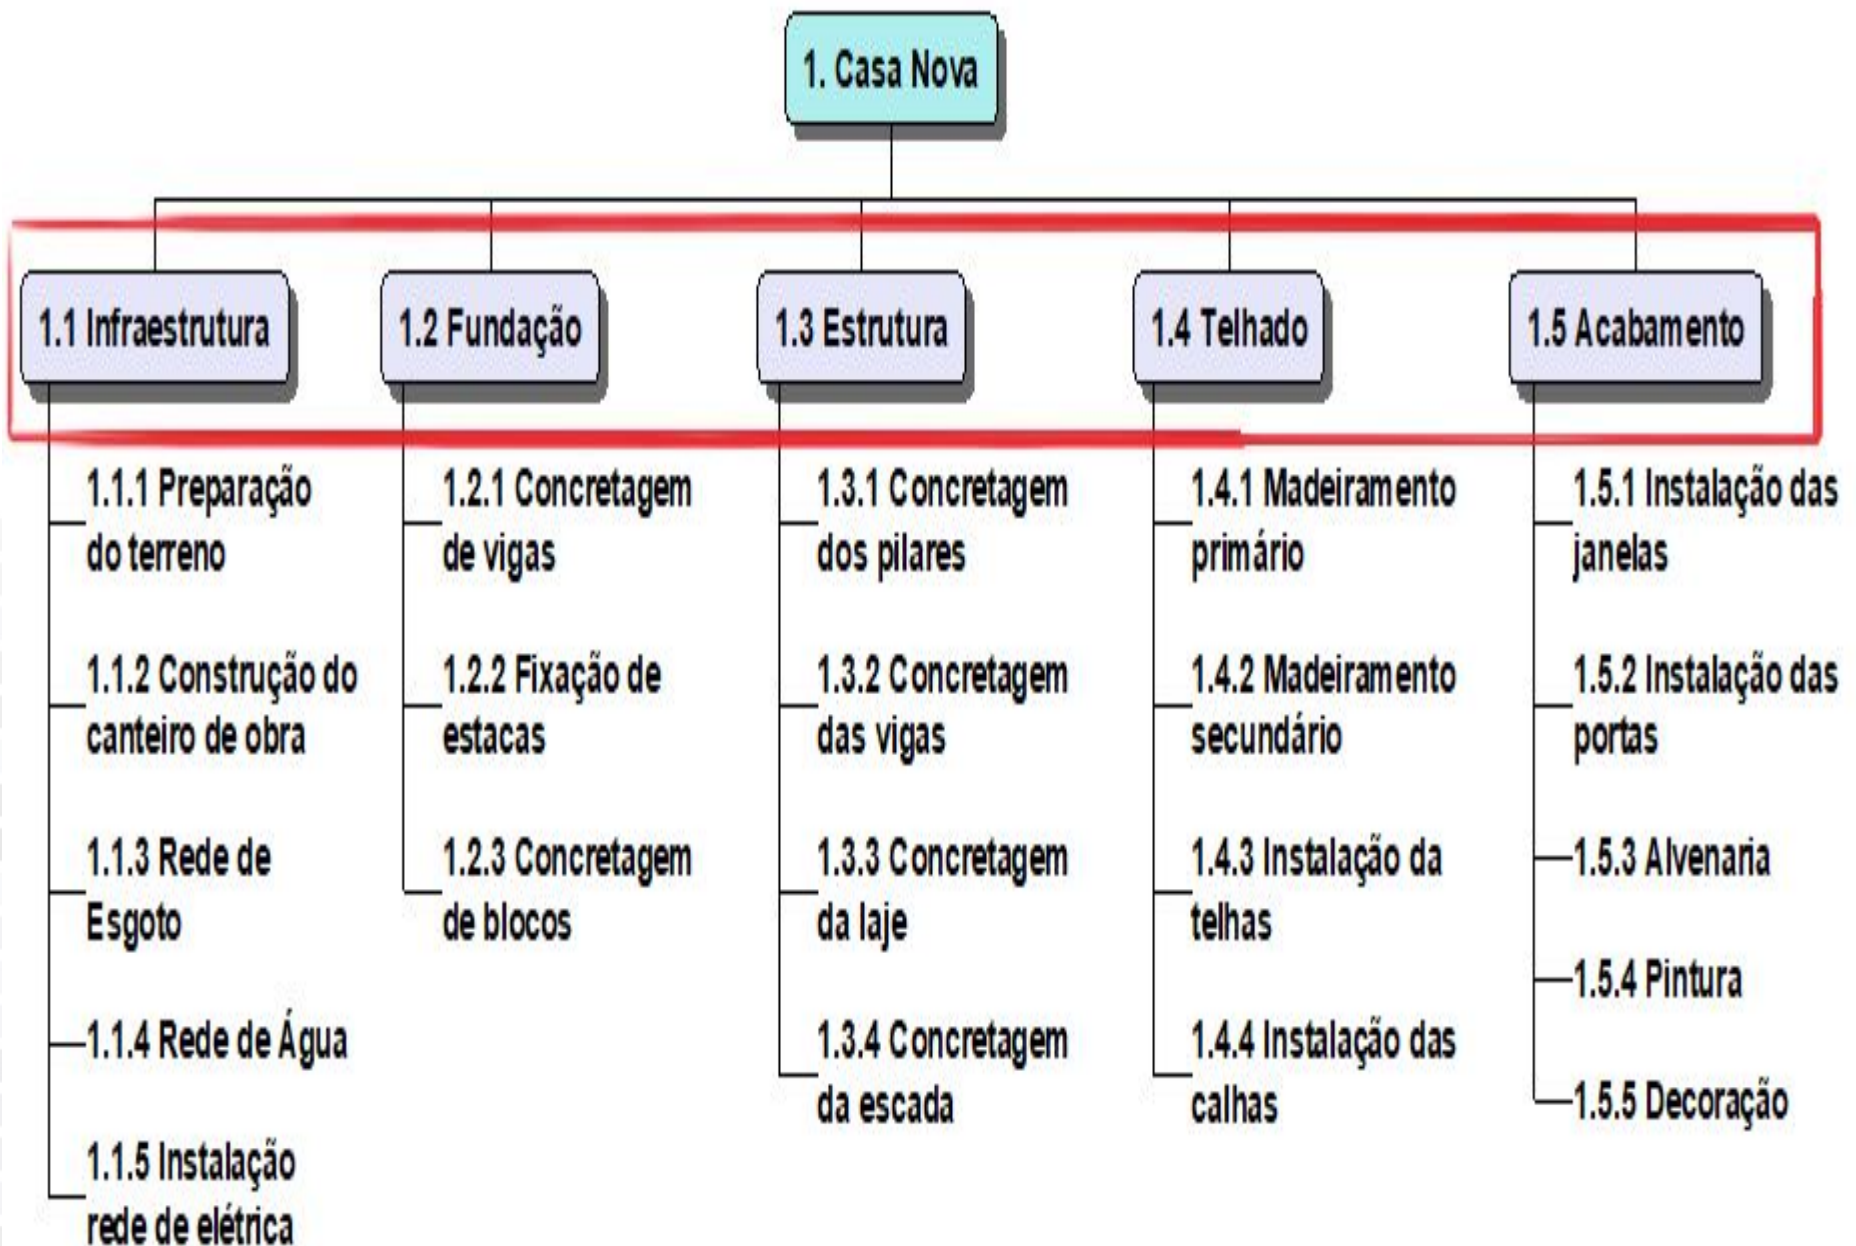

DÚVIDAS?

